Ağustos 2026

Aylık Gelişim Raporu

31 Ağustos 2026 · Kaan Ekimoz
Emre Bey · Büşra Hanım

📌 Kısaca

Ağustos'ta Patimania bir web sitesi olmaktan çıkıp, mobil uygulamasıyla birlikte yayına hazırlanan bir ürün hâline geldi.

✓ Web sitesi canlıda	**27+** mobil uygulama ekranı	**2** mağazada süreç başladı	**9** kesintisiz güncelleme
734 geliştirme adımı (commit)	**172.000** yazılan kod satırı	**3.900** dokunulan dosya	**31** gün kesintisiz çalışma

Sadece Ağustos ayında yapılan iş. Her "geliştirme adımı", tamamlanıp test edilmiş bir değişikliği ifade eder.

📱 Mobil uygulamada epey yol aldık


Uygulama **ön testi geçti** — bütün ekranlar gerçek sunucuya bağlı olarak çalışıyor. Şu an **kullanıcı testleri aşamasındayız** ve mağaza yayın süreci başladı. Teknik tarafta hazırız; kalan işler ürünle değil, şirketle ilgili.

🔴 Bizi durduran tek şey: şirket

Ürün hazır ama **henüz para kazanamıyor.** Ödeme altyapısı test ortamında baştan sona çalıştığı kanıtlandı, ancak canlıya alınabilmesi için şirketin kurulmuş olması gerekiyor. Bu tek eksik, dört ayrı işi aynı anda bekletiyor.

📱 Mobil Uygulama

Ay başında beklemede olan uygulama yeniden ele alındı ve büyük ölçüde tamamlandı. Bugün iPhone'da çalışan, **web sitesiyle görsel olarak birebir aynı** bir uygulamamız var.

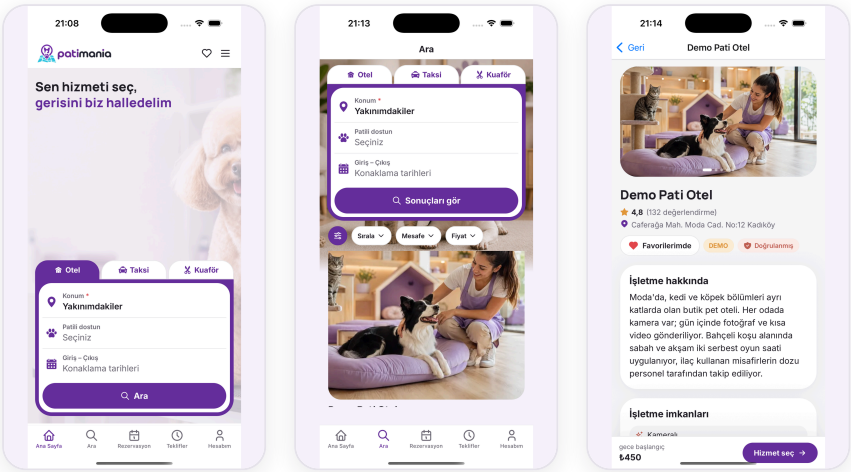

Ana sayfa | Arama sonuçları | İşletme profili

Uygulamadan gerçek ekran görüntüleri — mağaza sayfasında da bunlar kullanılacak.

Uygulamada neler var

- **Arama** — konuma, patili dosta ve tarihe göre pet otel, taksi ve kuaför bulma
- **İşletme profilleri** — fotoğraflar, puanlar, müşteri yorumları, imkânlar, harita
- **Pet taksi** — yolculuk talebi oluşturma, işletmelerden teklif toplama
- **Hesabım** — evcil hayvan profilleri, adresler, favoriler, mesajlar, rezervasyon geçmişi

🏪 Mağaza Yayın Süreci

✓ Geliştirme tamamlandı	✓ Ön test geçildi	● Kullanıcı testi sürüyor	○ Mağaza yayını şirket sonrası

Aşama	Durum
Google Play kaydı	AÇILDI Uygulama yüklendi, mağaza sayfası hazır
Google Play testi	KULLANICI TESTİ Test sürecinde, aşağıda anlatıldı
App Store kaydı	AÇILDI Uygulama oluşturuldu
App Store testi	SIRADA Eylül'ün ilk işi

Google Play — kullanıcı testi

Google, **kişisel geliştirici hesaplarına** özel bir kural uyguluyor: yayına çıkmadan önce 12 kişinin uygulamayı 14 gün boyunca kesintisiz test etmesi, sonra da Google'ın bir hafta incelemesi gerekiyor. Toplam **en az 3 hafta ek süre.**

Şirket hesabında bu kural hiç yok. Bu yüzden Play tarafında kullanıcı testi aşamasında kaldık — şirket kurulunca doğrudan yayına gidebiliriz. Apple'da böyle bir kural olmadığı için Eylül'de oradan devam ediyoruz.

💳 Ödeme Altyapısı (iyzico)

Ödeme tarafı sık sorulduğu için ayrı anlatmak istedim. **Zor kısım bitti, kalan kısım şirkete bağlı.**

Adım	Durum
iyzico pazaryeri hesabı	AÇILDI
Test ortamında bağlantı	ÇALIŞIYOR
İşletmeyi sisteme tanıtma	DENENDİ, GEÇTİ
Ödemeyi bölme (komisyon + işletme payı)	DENENDİ, GEÇTİ
İşletmeye para aktarma	DENENDİ, GEÇTİ
İade ve iptal	DENENDİ, GEÇTİ
Canlı anahtar ve sözleşme	ŞİRKET BEKLİYOR
Son bağlantı kodunun yazılması	SIRADA Canlı anahtar gelince, 3 gün

Bu ne demek?

Müşteri parasının işletmeye nasıl aktarılacağı, komisyonun nasıl kesileceği, iade nasıl yapılacağı — **hepsi test ortamında baştan sona denendi ve çalıştı.** Yani belirsizlik kalmadı. Şirket kurulup iyzico sözleşmesi imzalandığında, sistemin canlıya alınması 3 günlük iş.

🔴 Şirket Kuruluşu

Bu, raporun en önemli bölümü. **Ürün tarafında ilerlemeyi durduran şey artık yazılım değil, şirketin kurulmamış olması.**

Yapamadığımız iş	Neden	Sonuç
Ödeme almak	iyzico canlı sözleşmesi şirket istiyor	GELİR YOK
İşletmeye para aktarmak	Aracı kurum sıfatı şirket gerektiriyor	İŞ MODELİ KAPALI
Mağazada hızlı yayın	Şirket hesabı 3 haftalık test şartını kaldırıyor	GECİKME
Fatura kesmek	E-fatura, ETBİS kaydı ve sözleşmelerin karşı tarafı tüzel kişilik olmalı	YASAL ENGEL

Bir de zamanla artan bir maliyet var

Şu anda mağaza hesapları, alan adı ve sunucu **Kaan'ın kişisel hesapları üzerinde.** Uygulama yayınlandıktan sonra şirkete devredilebiliyor, ancak **kullanıcı sayısı arttıkça devir işlemi zorlaşıyor.** Ne kadar erken kurulursa devir o kadar kolay ve ucuz olur.

Şirket kurmalıyız

- **Şirket türü ve faaliyet kodları** — pazaryeri modeline uygun kuruluş
- **Mali müşavir** — komisyon faturası, işletmeye ödeme ve KDV düzeni
- **Sözleşmelerin son onayı** — metinler hazır, avukat onayı bekliyor
- **Takvim** — kuruluş ne zaman biter? Yayın planını buna göre kuracağız.

Bir de bekleyen tek karar var

İptal ve iade politikası. Müşteri rezervasyonunu iptal ederse ne kadar iade alacak, hangi süreye kadar ücretsiz iptal edilebilecek — bu netleşmeden ödeme akışının son hâli yazılamıyor. Diğer bilgilerde sıkıntı yok.

⚠️ Sitede şu an 46 işletme var — hepsi demo

Sistemi test edebilmek için oluşturduğumuz örnek işletmeler bunlar; **gerçek işletme kaydı henüz yok.** Google'da "Kadıköy pet otel" gibi aramalarda çıkabilmemiz için hazırladığımız sayfalar da bu yüzden bilinçli olarak kapalı — boş sayfa açmak arama motorunda kalıcı zarar veriyor. Bir ilçede en az 3 gerçek işletme olduğunda o sayfa kendiliğinden açılacak.

Yani büyümenin anahtarı: gerçek işletme kaydı.

Eylül'de Ne Yapacağız

Önce bunlar — her şeyin önünde

ACİL	**Şirket kuruluşunun başlaması** — ödemeyi, faturayı ve hızlı mağaza yayınını açan tek adım
ACİL	**İptal ve iade politikasının netleşmesi** — ödeme akışının son hâli buna bağlı
ACİL	**İlk gerçek işletmelerin sisteme kaydı** — büyümenin tek anahtarı; sitedeki 46 işletmenin hepsi hâlâ demo

İşletme paneli — asıl işimiz burada

YÜKSEK	**Panelim ekranı** — 7 günlük rezervasyon takvimi, altında onay bekleyenler; takside gelen teklifler
YÜKSEK	**Yeni işletme kurulum rehberi** — kaydolan işletme ilk gün tek başına hizmet ve fiyat girebilsin
YÜKSEK	**Listelerin sadeleşmesi** — rezervasyonlar kompakt satır hâline gelecek, ayrıntı yandan açılan pencerede görünecek
YÜKSEK	**Telefonda panel** — işletme sahiplerinin çoğu masaüstü kullanmıyor; panelin telefonda rahat çalışması
YÜKSEK	**Fotoğraf ve hizmet girişinin kolaylaşması** — toplu yükleme, sürükle-bırak, hazır hizmet şablonları
SONRA	**Başvuru → onay süresinin kısalması** — inceleme ekranının hızlandırılması
SONRA	**Bildirim tercihleri** — yeni rezervasyonda e-posta/telefon bildirimi ayarları

Gerçek işletmeler gelince yapılacak düzenlemeler

YÜKSEK	**Demo işletmelerin temizlenmesi** — gerçek kayıtlar geldikçe örnek veriler kaldırılacak
SONRA	**Arama sıralaması** — gerçek puan, doluluk ve mesafeye göre yeniden ayarlanacak
SONRA	**İlçe sayfalarının açılması** — bir ilçede 3 gerçek işletme olunca "Kadıköy pet otel" sayfası açılacak

Uygulama ve altyapı

YÜKSEK	**iOS uygulamasının test aşamasına çıkması** — Eylül'ün ilk işi
SONRA	**Ödemenin canlıya alınması** — şirket ve iyzico sözleşmesi tamamlandığında 3 gün
SONRA	**Kesinti uyarı sistemi** — site durursa bize haber gelsin
SONRA	**Google'da bulunurluk** — işletme sayfalarının arama sonuçlarında düzgün görünmesi

✓Özetle

Web sitesi canlı ve çalışıyor. Mobil uygulamada epey yol aldık — ön test geçildi, mağaza süreçleri başladı. Ödeme altyapısı test ortamında kanıtlandı.

Bundan sonraki hızımızı belirleyecek olan yazılım değil; şirket kuruluşu ve bekleyen iş kararları.
